



ASIAN DEVELOPMENT BANK

FORUM KOORDINASI PERSIAPAN LELANG REHABILITASI DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PROVINSI & KABUPATEN *LOAN INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)*

Tangerang Selatan, 29 Oktober 2019

NPIU IRIGASI DAN RAWA

 **DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA**
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



PROFIL SINGKAT IPDMIP

PROFIL SINGKAT PROGRAM

Sumber Pendanaan

Total : US\$ 1,600 mio

Loan Signing	31 Jul 2017
Effective	08 Sep 2017
Loan Closing	30 Jun 2023

Menggunakan Sistem
Result Based Lending (RBL)



>>> Awal :

ESTIMASI KERUSAKAN	TOTAL DI. REHAB	REHAB per KEWENANGAN			Total Target Area Rehab	Jumlah Prov / Kab
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN		
> 40 %	710	143,872 Ha	55,887 Ha	126,559 Ha	500.000 Ha	16 / 74
		44.09 %	17.13 %	38.78 %		

>>> Update per Juni 2019 :

ESTIMASI KERUSAKAN	TOTAL DI. REHAB	REHAB per KEWENANGAN			Total Target Area Rehab	Jumlah Prov / Kab
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN		
> 40 %	750	153,055 Ha	53,308 Ha	124,808 Ha	500.000 Ha	16 / 74
		46.22 %	16.10 %	37.68 %		

INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)

Item	Program IPDMIP
Dampak / Outcome	Keberkelanjutan dan peningkatan produksi pertanian beririgasi di 74 kabupaten
Keluaran / Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguatnya sistem dan kapasitas kelembagaan pertanian beririgasi berkelanjutan; 2. Meningkatnya operasi, pemeliharaan, dan pengelolaan irigasi; 3. Meningkatnya infrastruktur irigasi; dan 4. Meningkatnya pendapatan pertanian beririgasi.
Kegiatan	Memperbaiki panduan-panduan teknis; Operasionalisasi KOMIR; meningkatkan pengelolaan aset dan anggaran berbasis kebutuhan menggunakan sistem informasi; pendirian Persatuan Petani Pengguna Air (P ₃ A); Penguatan kelembagaan sumberdaya air; dan rehabilitasi atau peningkatan infrastruktur irigasi.
Komponen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Kerangka Kelembagaan di Daerah Pertanian Beririgasi 2. Peningkatan Sistem dan Kapasitas Pengelolaan, Operasional dan Pemeliharaan Irigasi 3. Peningkatan Infrastruktur Sistem Irigasi 4. Meningkatkan Pendapatan Irigasi Pertanian
Jangkauan Wilayah	74 Kabupaten dalam 16 Provinsi; 21 B/BWS
Periode Pelaksanaan	2017–2021

INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)

Item	Program IPDMIP
Anggaran Program	\$1,679 million atau setara dengan Rp. 22 triliun (APBN & APBD 63% ; PHLN 37%)
Nilai Pinjaman	
ADB	\$ 500 million atau setara dengan Rp. 6.5 triliun
AIF	\$ 100 million atau setara dengan Rp. 1.3 triliun
IFAD	93 million EURO atau setara dengan Rp. 1.3 triliun
Sifat Pinjaman	
ADB dan AIF	<i>Result Based Lending (RBL) – Pinjaman Berbasis Hasil</i>
IFAD	<i>Project Loan – Pinjaman Proyek</i>
Nomor PHLN	
ADB	3529- INO
AIF	8327 – INO
IFAD	200001445
Nomor Register	
ADB	1Z83YQPA
AIF	11DDKS1A
IFAD	1116F8FA
Closing Date	
ADB dan AIF	30 Juni 2023
IFAD	31 Maret 2023



KOMPONEN KEGIATAN (1)

Komponen

Komponen 1. Penguatan Kerangka Kelembagaan di Daerah Pertanian Beririgasi

1.1. Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi --> *Bangda, OP*

1.2. Memperbaharui, menerbitkan & mensosialisasikan peraturan/pedoman teknis

Utama --> *Bangda, OP, Irwa*

1.3. Pembuatan Sistem Sertifikasi Kompetensi untuk Staf dan Fasilitator --> *OP*

1.4. Membangun, Memonitor, dan Mengevaluasi Rencana Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi di tingkat Kabupaten --> *Bangda*

1.5. Membuat Konsep Unit Pengelola Daerah Irigasi (IMU) dan melaksanakan percontohan

DI terpilih --> *OP*

1.6. Memastikan Koordinasi antara stakeholder proyek dan memastikan efisiensi pelaksanaan

proyek --> *PJSDA*

1.7. Penguatan kapasitas staf dan fasilitator irigasi --> *PJSDA*

Komponen 2. Peningkatan Sistem dan Kapasitas Pengelolaan, Operasional, dan Pemeliharaan Irigasi

2.1. Peningkatan Perangkat Lunak Sistem Informasi Aset Irigasi (Sistem PAI-RP2I) --> *OP*


2.2. Penyusunan Pengkajian aspek teknis (infrastruktur dan pertanian), sosial, ekonomi, perubahan iklim dan kelembagaan di tingkat DI --> *Bangda*

2.3. Pengumpulan dan pemrosesan pemetaan udara dan informasi kondisi aset di daerah irigasi untuk 2.5 juta hektar daerah irigasi --> *OP*

2.4. Penyusunan Rencana Pengelolaan Lahan Pertanian Beririgasi di tiap daerah irigasi dan tingkat kabupaten (RP2I) --> *OP*

2.5. Melaksanakan Penilaian Kinerja Irigasi dan Identifikasi Kesenjangan Pelayanan --> *OP*

2.6. Pembentukan, reorganisasi, dan penguatan Persatuan Petani Pengguna Air (P3A), GP3A, dan IP3A --> *OP*



KOMPONEN KEGIATAN (2)

Komponen


Komponen 3. Peningkatan Infrastruktur Sistem Irigasi

- 3.1. Penyiapan dan validasi *water accounting* untuk Daerah Irigasi Besar menggunakan teknologi satelit --> *Irwa*
- 3.2. Uji Coba Modernisasi Sistem Irigasi di DI terpilih --> *Irwa*
- 3.3. Pemilihan, evaluasi, dan desain rehabilitasi & peningkatan daerah irigasi dengan pendekatan partisipatif --> *Irwa*
- 3.4. Rehabilitasi, peningkatan, dan modernisasi daerah irigasi dengan berbagai sumber pendanaan --> *Irwa*
- 3.5. Peningkatan pengukuran air dan pengenalan teknologi hemat air / Kampanye Penyadaran Efisiensi Air --> *Irwa*
- 3.6. Pemasangan Turbin Hidropower di saluran irigasi-lokasi terpilih --> *Irwa*

Komponen 4. Peningkatan Pendapatan Irigasi Pertanian

- 4.1. Peningkatan Produktivitas & Jasa Pelayanan --> *Pertanian*
- 4.2. Peningkatan Akses Pasar & Jasa Pelayanan --> *Pertanian*
- 4.3. Peningkatan Jasa Pelayanan Finansial & Penggunaannya --> *Pertanian*

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN - IPDMIP

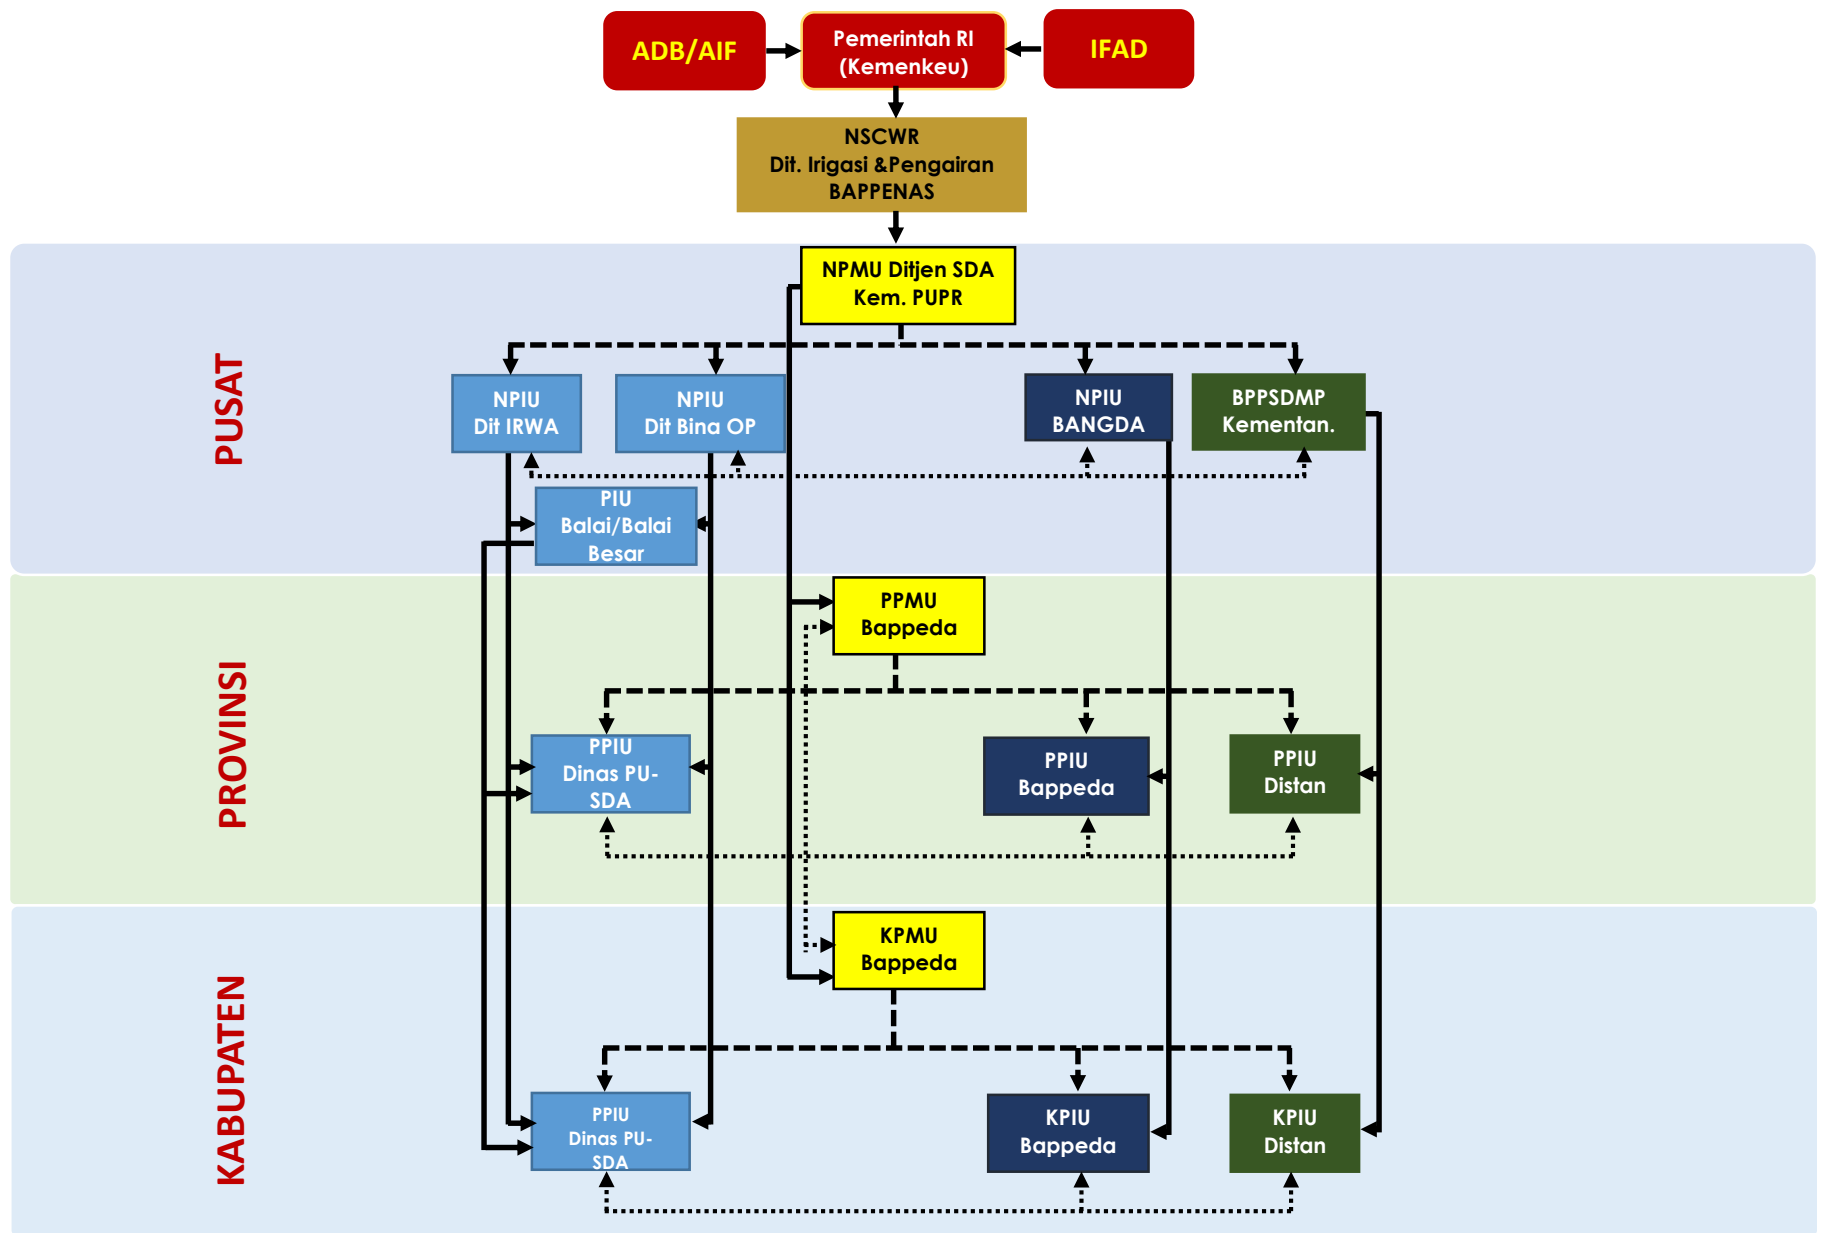



PELAKSANAAN & UPDATE DLI 8




Keterlibatan dalam IPDMIP:

1. NPIU (National Program Implementation Unit) bidang Keirigasan
2. Bertanggung jawab melaksanakan kegiatan REHABILITASI DAERAH IRIGASI (DI) ± 500.000 Ha
3. Komponen III “Peningkatan Infrastruktur Sistem Irigasi”
4. DLI 2 “Pedoman Updating/Pembaharuan KP + Pedoman PROM/POP”
5. DLI 8 “Rehabilitasi Infrastruktur Irigasi di 16 Provinsi Meningkatkan Hingga 500.000 Ha pada Tahun 2021”

Detail Komponen III:

- Penyiapan & validasi *water accounting* untuk DI besar dengan menggunakan Teknologi Satelit (2)
- Uji coba modernisasi sistem irigasi pada beberapa DI terpilih
- Desain rehabilitasi/peningkatan DI dengan pendekatan partisipatif (3)
- Paket Konsultan di tingkat Nasional dan BBWS
- Rehabilitasi/peningkatan & modernisasi DI (4) – PROM (5)
- Mengembangkan teknologi pengukuran air & hemat air
- Pengembangan pembangkit listrik tenaga mikro-hidro di saluran irigasi pada lokasi terpilih

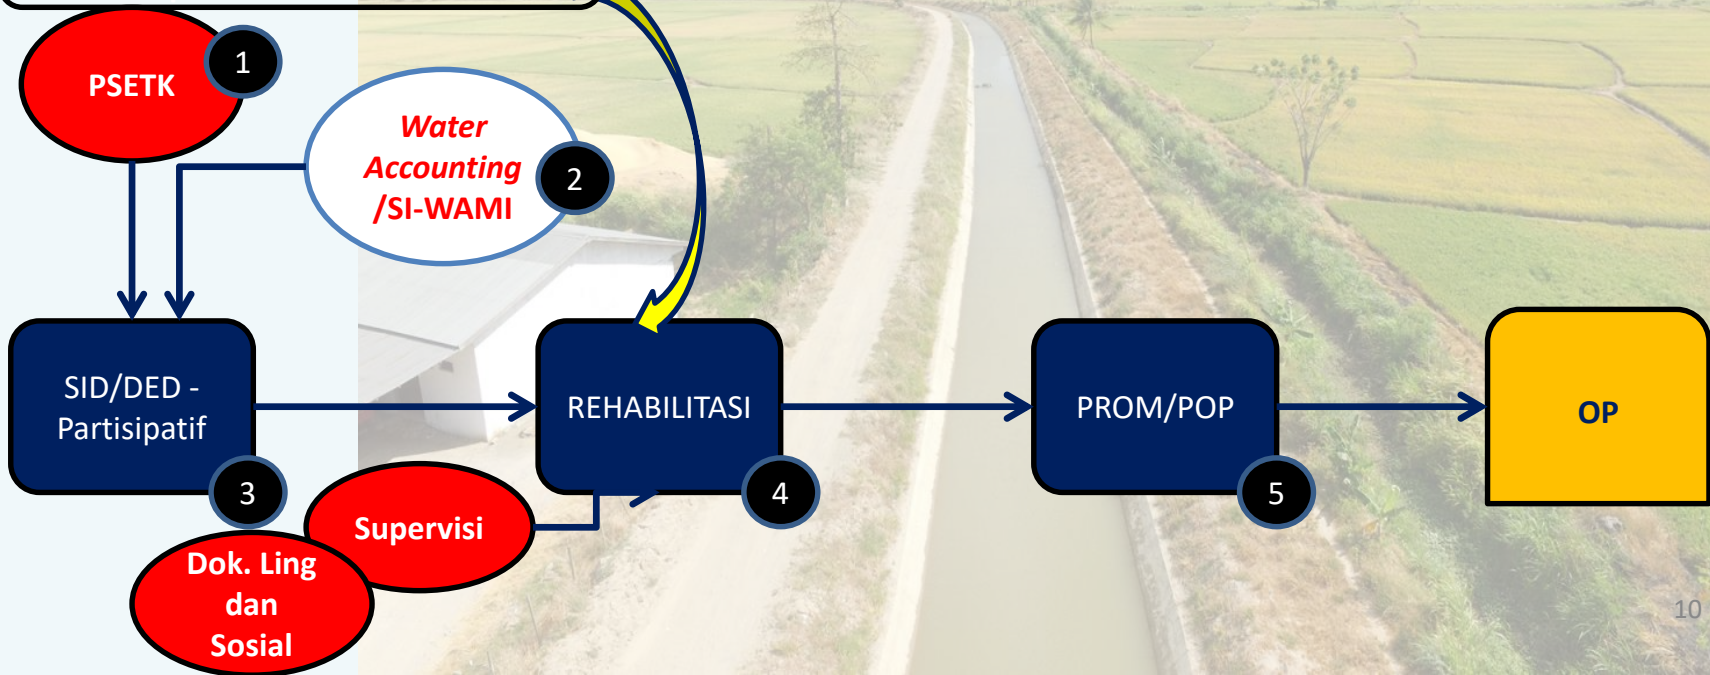

DLI-8 : Rehabilitasi (Ha)

- ✓ 2017: **PASTIKAN** terdapat 45,000 yang sudah di rehab melalui IPDMIP Loan atau APBD/DAK dan dapat di verifikasi di 2017 atau 2018 awal
- ✓ 2018: **PASTIKAN** terdapat 100,000 yang sudah di rehab melalui IPDMIP Loan atau APBD/DAK dan dapat di verifikasi di 2018 atau 2019 awal (kumulatif 145,000 ha)
- ✓ 2019: **PASTIKAN** terdapat 155,000 yang sudah di rehab melalui IPDMIP Loan atau APBD/DAK dan dapat di verifikasi di 2019 atau 2020 awal (kumulatif 300,000 ha)
- ✓ 2020: **PASTIKAN** terdapat 100,000 yang sudah di rehab melalui IPDMIP Loan atau APBD/DAK dan dapat di verifikasi di 2020 atau 2021 awal (kumulatif 400,000 ha)
- ✓ 2021: **PASTIKAN** terdapat 100,000 yang sudah di rehab melalui IPDMIP Loan atau APBD/DAK dan dapat di verifikasi di 2021 atau 2022 awal (kumulatif 500,000 ha)


PERHATIKAN TITIK-TITIK KRITIS

Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
2017	45000	33000	Proses pengumpulan Kelengkapan Data Pendukung
2018	100000	85194	Proses Verifikasi BPKP
2019	155000		
2020	100000		
2021	100000		
Total	500000		

Kendala:

- Minimnya dukungan pengumpulan data pendukung hasil capaian DLI 8 terutama dari pembiayaan DAK maupun APBD;
- Penyampaian informasi ke masing-masing Instansi di masing-masing kewenangan mengenai capaian DLI 8 yang tidak hanya dapat didapatkan melalui kontribusi pelaksanaan rehabilitasi dengan pendanaan IPDMIP akan tetapi pendanaan dengan non IPDMIP juga dapat dimasukkan ke dalam hasil capaian.

ALUR PENCAPAIAN DLI 8

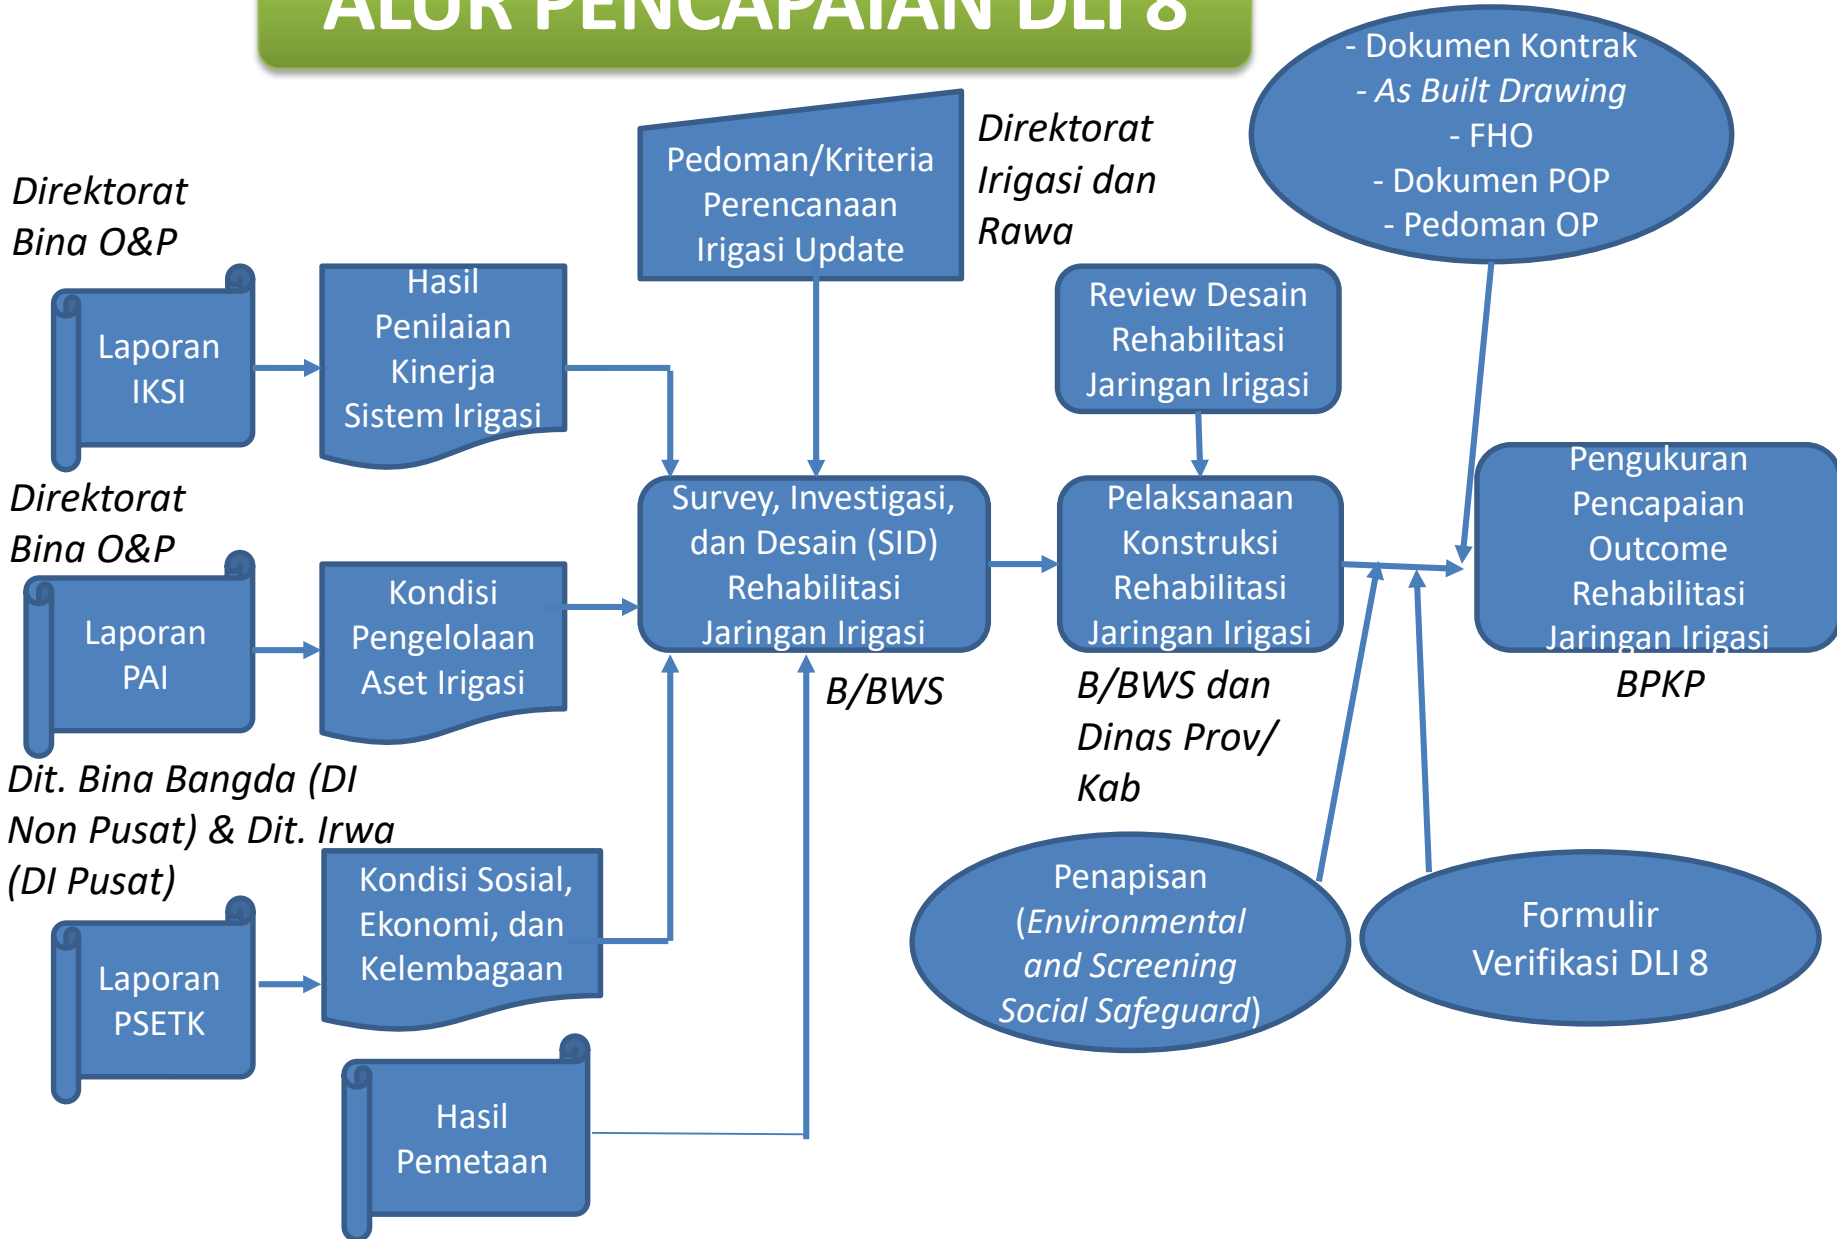

Survey, Investigasi, dan Desain (SID)

- SID mengacu kepada KP-Irigasi dan menerapkan Prinsip-Prinsip Modernisasi Irigasi (sebagian);
- Dilaksanakan oleh Konsultan SID Rehabilitasi untuk masing-masing kewenangan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten);
- Pelaksanaan Kegiatan SID Rehabilitasi diawasi dengan ketat (mengundang Balai dan Konsultan untuk mempresentasikan hasil desain).

[Update Progres SID \(per 25 Oktober 2019\)](#)

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

- Pengadaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi sesuai dengan Peraturan Presiden Tahun 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
- Pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan secara swakelola dan kontraktual sesuai dengan Peraturan;
- Pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi diawasi oleh supervisi;
- Pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi dengan pendekatan partisipatif mengacu kepada Permen PUPR No. 30 Tahun 2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (PPSI).

Persiapan Operasi dan Pemeliharaan (Fasilitas OP)

- Updating Manual OP melalui uji pengaliran, melengkapi fasilitas OP, dan pemberdayaan P3A;
- Fasilitas OP: Peralatan OP, Sarana Transportasi, Alat Kantor Pelaksana OP, Alat Komunikasi, Kantor, Perumahan, & Gudang;
- Fasilitas OP diakomodir dalam kegiatan SID yang dilakukan oleh Konsultan SID baik untuk Kewenangan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten di bawah koordinasi B/BWS di 16 Provinsi & 74 Kabupaten.

FASILITASI OP

Peralatan OP

- Alat-alat dasar untuk pemeliharaan rutin
- Perlengkapan personil untuk operasi
- Peralatan berat untuk pembersihan lumpur dan pemeliharaan tanggul

Transportasi

- Kepala Ranting/ Pengamat (**Sepeda motor**)
- Juru/Mantri (**Sepeda motor**)
- PPA/POB (Sepeda)

Alat-alat kantor Pelaksana OP

- Perabot dasar untuk kantor
- Alat kerja di kantor

Alat komunikasi

- Jaringan komunikasi yang memadai untuk Ranting/ Pengamat – Subdin OP

Kantor, Perumahan dan Gudang

- Kantor Ranting
- Kantor Pengamat
- Rumah Pengamat/Ranting
- Rumah Mantri/Juru
- Gudang Ranting/ Pengamat

Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial dan Lingkungan

- Dokumen Lingkungan (SPPL, UPL/ UKL, atau AMDAL dilaksanakan pada saat rehabilitasi;
- Dokumen jaring pengaman sosial dilaksanakan sesuai dengan hasil *screening* oleh Konsultan SID;
- Perlu alokasi penganggaran khusus di instansi masing-masing kewenangan karena tidak dislot kan anggaran dari dana IPDMIP.



PROGRAM & CAPAIAN SID IPDMIP

CATATAN HASIL PEMBAHASAN DESAIN SECARA UMUM

- Dalam setiap laporan harus berbasis 5 pilar irigasi;
- Masih terdapat beberapa perhitungan hidrologi, neraca air dan dimensi infrastruktur oleh konsultan yang belum sesuai dengan KP Irigasi dan SNI;
- Masih terdapat beberapa pengukuran peta 1:2000 dan peta 1:5000 yang masih dengan menggunakan metode GPS untuk elevasi ketinggian (nilai z) nya;
- Masih terdapat gambar desain yang belum sesuai dengan standar penggambaran;
- Survey PSETK yang dilakukan oleh konsultan kurang mendalam sehingga belum terlihat profil sosial ekonomi benefit dan profitnya;
- Konsultan harus melengkapi dokumen lelang, spesifikasi teknis, metoda pelaksanaan, RAB, gambar kerja, serta Manual OP.

PROGRAM & CAPAIAN SID IPDMIP DI KEWENANGAN PUSAT

Status : 25 Oktober 2019

NO	URAIAN	Jumlah DI	Konsultan SID	Nilai Kontrak	Nilai DIPA	Kontrak			Tahap SID			% PROGRES			Keterangan
				Rp (x 1000.000)	Rp (x 1000.000)	Mulai	Selesai	Durasi	Lap. Pendahuluan	Lap. Interim	Lap. Akhir	% KEU	FISIK		
													%	Laporan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
I	BWS SUMATERA I	1	PT. Suwanda Karya Mandiri KSO PT Bhawana Prasasta	8.569	1.591	29-Nop-18	22-Mar-20	16 Bln	22-Feb-19	27-Mar-19	26-Nop-19	72,22	91,16	Lap. Interim	
II	BWS SUMATERA II	1	PT. Bina Buana Raya	9.669	1.980	29-Nop-18	Juli 2020	20 Bln	18-Jan-19	20-Mei-19	07-Okt-19	83,52	78,90	Lap. Akhir	
III	BWS SUMATERA V	2	PT. Intimulya Multikencana KSO Maxitech Utama Indonesia	8.127	1.394	25-Okt-18	01-Jan-20	15 Bln	28-Jan-19	01-Agust-19	18-Nop-19	57,14	57,14	Lap. Pendahuluan	DI Prioritas Kew. Pusat pada TA 2020
IV	BBWS SUMATERA VIII	5	PT. Widya Graha Asana KSO PT. Mitra Karya Sanjaya	11.641	1.000	02-Jan-19	25-Mei-20	15 Bln	01-Feb-19	2 Juli 2019; 1-2 Okt 2019	09-Des-19	48,89	50,00	Lap. Interim 2	
V	BBWS MESUJI SEKAMPUNG	2	PT. Suwanda Karya Mandiri	9.317	2.962	21-Nop-18	Des. 2019	13 Bln	26-Feb-19	08-Jul-19	05-Agust-19	70,00	84,46	Lap. Interim	
VI	BBWS C3	1	PT. Daya Cipta Dianrancana	3.280	2.000	28-Sep-18	Okt 2019	13 Bln	20-Feb-19	15-Apr-19	01-Agust-19	53,64	102,18	Lap. Interim	Nilai % Fisik masih perlu konfirmasi Balai karena ada error dalam menginput data emon
VII	BBWS CILIWUNG CISADANE	0													
VIII	BBWS CITARUM	1	PT. Saka Buana Yasa Selaras	2.532	1.281	20-Des-18	13-Nop-19	11 Bln	12-Feb-19	25-Apr-19	02-Okt-19	74,49	74,49	Lap. Interim	
IX	BBWS CITANDUY	2	PT. Aztindo Rekapardana PT. Rencana Cipta Mandiri KSO PT. Purnatama Kindoteknik	19.955	3.630	20-Des-18	Des-19	12 Bln	29-Jan-19	25-Jun-19	02-Mar-20	68,98	78,88	Lap. Interim	
X	BBWS CIMANUK CISANGGARUNG	2	PT. Nadiputra Pratama	8.188	2.586	23-Okt-18	Jan-20	15 Bulan	14-Jan-19	13 Mei 2019; 24 Mei 2019; 4 Jul 2019	25-Nop-19	46,54	83,71	Lap. Interim 3	

PROGRAM & CAPAIAN SID IPDMIP DI KEWENANGAN PUSAT (LANJUTAN)

Status : 25 Oktober 2019

NO	URAIAN	Jumlah DI	Konsultan SID	Nilai Kontrak	Nilai DIPA	Kontrak			Tahap SID			% PROGRES			Keterangan
				Rp (x 1000.000)	Rp (x 1000.000)	Mulai	Selesai	Durasi	Lap. Pendahuluan	Lap. Interim	Lap. Akhir	% KEU	FISIK		
													%	Laporan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
XI	PEMALI JUANA	5	PT. Mitraplan Enviratama			12-Jun-19	09-Dec-19	6 Bulan	09-Jul-19	29-Okt-19	29-Nop-19	68,00	68,00	Lap. Pendahuluan	Laporan Pendahuluan dilakukan di Balai
			PT. Aditya Engineering Consultant			12-Jun-19	09-Dec-19	6 Bulan	09-Jul-19	29-Okt-19	29-Nop-19	67,00	67,00	Lap. Pendahuluan	Laporan Pendahuluan dilakukan di Balai
			PT. Inakko Internasional			12-Jun-19	09-Dec-19	6 Bulan	09-Jul-19	29-Okt-19	29-Nop-19	67,00	67,00	Lap. Pendahuluan	Laporan Pendahuluan dilakukan di Balai
			PT. Supraharmonia Consultindo			12-Jun-19	09-Dec-19	6 Bulan	09-Jul-19	29-Okt-19	29-Nop-19	64,00	64,00	Lap. Pendahuluan	Laporan Pendahuluan dilakukan di Balai
XII	BBWS SERAYU OPAK	1	PT. Daya Cipta Dianrancana	1.577	5.181	11-Dec-18	Okt 2019 (adendum 2 Bulan)	10 Bln (+2 adendum)	25-Jan-19	29 April 2019; 2 Juli 2019	22-Jul-19	-	-	-	
XIII	BBWS BENGAWAN SOLO	1	PT. Indra Karya KSO PT. Tuah Agung Anugrah	5.662	1.000	31-Agust-18	Des. 2019	16 Bln	30-Jan-19	9-Apr-19	24-Okt-19	20,00	84,96	Lap. Interim	
XIV	BBWS BRANTAS	3	PT. Jasa Patria Gunatama KSO PT. Arga Pasca Rencana	9.029	1.727	12-Dec-18	7 Des 2019	12 Bln	26-Mar-19	15-Jul-19	30-Okt-19	59,98	75,34	Lap. Interim	Diskusi Teknik DI Bondoyudo dilaksanakan pada Selasa 15 Oktober 2019
XV	BWS KALIMANTAN I	1	PT. Daya Cipta Dianrancana KSO PT. Intimulya Multikencana	2.904	1.742	14-Sep-18	4 Juni 2019 (adendum 2 bln)	6 Bln (+2 Bln)	06-Feb-19	15-Mei-19	20-Jun-19	56,14	104,13	Lap. Akhir	- Nilai % Fisik Kewenangan Pusat masih perlu konfirmasi Balai karena ada error dalam menginput data emon. - Laporan akhir dibahas di Pontianak sekaligus melakukan kunjungan lapangan.
XVI	BWS KALIMANTAN II	3	PT. Indra Karya	8.398	2.022	29-Nop-18	23-Nop-19	12 Bulan	15-Jan-19	16 Mei 2019; 28 Juni 2019	01-Okt-19	14,41	89,67	Lap. Interim 2	
XVII	BWS SULAWESI I	2	PT. Vitraha	4.186	1.272	30-Nop-18	Nop. 2019	12 Bln	04-Feb-19	27-Mar-19	22-Mei-19	60,66	85,05	Lap. Interim	
XVIII	BWS SULAWESI III	3	PT. Indra Karya KSO PT. Tuah Agung Anugrah	3.977	1.314	29-Nop-18	Maret 2021	28 Bln	17-Jan-19	11 Juni 2019 DI Prioritas (Kew. Pusat,	03-Okt-19	66,67	84,94	Lap. Interim 3	
XIX	BBWS POMPENGAN JENEBERANG	3	PT. Bina Buana Raya	7.314	1.181	30-Nop-18	24-Nop-19	12 Bln	19-Dec-18	24-Apr-19	14-Okt-19	52,00	57,00	Lap. Interim	21

PROGRAM & CAPAIAN SID IPDMIP DI KEWENANGAN PUSAT (LANJUTAN)

Status : 25 Oktober 2019

NO	URAIAN	Jumlah DI	Konsultan SID	Nilai Kontrak	Nilai DIPA	Kontrak			Tahap SID			% PROGRES			Keterangan
				Rp (x 1000.000)	Rp (x 1000.000)	Mulai	Selesai	Durasi	Lap. Pendahuluan	Lap. Interim	Lap. Akhir	% KEU	FISIK		
												%	Laporan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
XX	BWS NUSA TENGGARA I	6	PT. Indra Karya KSO	11.519	1.000	27-Des-18	04-Jan-20	13 Bln	11-Mar-19	28-Agust-19	06-Jan-20	42,92	57,82	Lap. Interim	
			PT. Caturbina Guna		1.181	27-Des-18	04-Jan-20	13 Bln				49,14	58,32	Lap. Interim	
XXI	BWS NUSA TENGGARA II	4	PT. Vitraha Consindotama	14.236	2.847	20-Des-18			04-Mar-19	4 Juli 2019; 23 Okt 2019	27-Nop-19	58,11	85,20	Lap. Interim 2	
			PT. Kencana Layana Konsultan			20-Des-18						74,18	87,20	Lap. Interim 2	
TOTAL		49		124.094	32.932										

PROGRAM & CAPAIAN SID IPDMIP DI KEWENANGAN PROVINSI

Status : 25 Oktober 2019

NO	URAIAN	Jumlah DI	Konsultan SID	Nilai Kontrak	Nilai DIPA	Kontrak			Tahap SID			% PROGRES			Keterangan
				Rp (x 1000.000)	Rp (x 1000.000)	Mulai	Selesai	Durasi	Lap. Pendahuluan	Lap. Interim	Lap. Akhir	% KEU	FISIK		
													%	Laporan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
I	BWS SUMATERA I	5	PT Rayakonsult KSO PT Satyakarsa Mudatama	6.182	1.325	29-Nop-18	23-Nop-19	12 Bulan	22-Feb-19	27-Mar-19	26-Nop-19	65,00	88,70	Lap. Interim	
II	BWS SUMATERA II	5	PT. Supraharmonia Consultindo KSO PT. Multimer Harapan	9.669	1.980	29-Nop-18	Juli 2020	20 Bulan	18-Jan-19	20-Mei-19	07-Okt-19	83,52	78,90	Lap. Akhir	
				7.981	2.202							83,06	75,64	Lap. Akhir	
III	BWS SUMATERA V	8	PT. Bina Buana Raya KSO PT. Aria Jasa Konsultan	9.295	1.394	25-Okt-18	Jan-20	15 Bulan	28-Jan-19	01-Agust-19	18-Nop-19	57,14	57,14	Lap. Pendahuluan	DI Prioritas Kew. Provinsi pada TA 2020
IV	BBWS SUMATERA VIII	17	PT. Aditya Engineering Consultant PT. Suwanda Karya Mandiri	7.974	800	03-Des-18	25-Feb-20	15 Bulan	01-Feb-19	2 Juli 2019; 1-2 Okt 2019	09-Des-19	47,06	50,00	Lap. Interim 1	
				8.499	800	03-Des-18	25-Feb-20	15 Bulan				47,06	50,00	Lap. Interim 2	
V	BBWS MESUJI SEKAMPUNG	5	PT. Aditya Engineering Consultant	4.709		21-Nop-18	Sept. 2019	10 Bulan	26-Feb-19	08-Jul-19	05-Agust-19	70,00	92,18	Lap. Interim	
VI	BBWS C3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII	BBWS CILIWUNG CISADANE	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIII	BBWS CILIWUNG	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIII	BBWS CITARUM	2	PT. Aztindo Rekaperdana	1.614	653	20-Des-18	13-Nop-19	11 Bulan	12-Feb-19	25-Apr-19	02-Okt-19	74,48	74,48	Lap. Akhir	
IX	BBWS CITANDUY	1	PT. Mitraplan Enviratama KSO PT. Nadiputra Pratama	3.814	350	20-Des-18	Apr-20	16 Bulan	29-Jan-19	05-Agust-19	02-Mar-20	68,75	69,02	Lap. Interim	- Nilai kontrak, dipa, progress keuangan dan fisik kew. Provinsi termasuk dengan nilai kew. Kab/Kota
X	BBWS CIMANUK CISANGGARUNG	5	PT. Nadiputra Pratama	8.188	2.586	23-Okt-18	15-Jan-20	15 Bulan	14-Jan-19	13 Mei 2019; 24 Mei 2019; 4 Jul 2019	25-Nop-19	46,54	83,71	Lap. Interim 3	
XI	BBWS PEMALI JUANA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XII	BBWS SERAYU OPAK	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

PROGRAM & CAPAIAN SID IPDMIP DI KEWENANGAN KABUPATEN /KOTA

Status : 25 Oktober 2019

NO	URAIAN	Jumlah DI	Konsultan SID	Nilai Kontrak	Nilai DIPA	Kontrak			Tahap SID			% PROGRES			Keterangan
				Rp (x 1000.000)	Rp (x 1000.000)	Mulai	Selesai	Durasi	Lap. Pendahuluan	Lap. Interim	Lap. Akhir	% KEU	FISIK		
													%	Laporan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
I	BWS SUMATERA I	36	PT. Global Parasindo Jaya	7.077	1.265	29-Nop-18	23-Des-19	13 Bulan	22-Feb-19	27-Mar-19	26-Nop-19	80,00	82,60	Lap. Interim	
II	BWS SUMATERA II	26	PT. Supraharmonia Consultindo KSO PT. Multimera Harapan	7.981	2.202	29-Nop-18	Jul-20	20 Bulan	18-Jan-19	20-Mei-19	07-Okt-19	83,06	75,64	Lap. Akhir	- Nilai kontrak, dipa, progress keuangan dan fisik kew. Kab/Kota termasuk dengan nilai kew. Provinsi 2
III	BWS SUMATERA V	41	PT. Globetek Glory Konsultan KSO PT. Gracia Widyakarsa	8.940	1.394	25-Okt-18	Jan-20	15 Bulan	28-Jan-19	01-Agust-19	18-Nop-19	57,14	57,14	Lap. Interim	
IV	BBWS SUMATERA VIII	44	PT. Rayakonsult KSO PT. Brahmaseta Indonesia	8.234	500	03-Des-18	25-Feb-20	15 Bulan	01-Feb-19	2 Juli 2019; 1-2 Okt 2019	09-Des-19	47,06	50,00	Lap. Interim 2	
			PT. Supraharmonia Consultindo KSO PT. Yodya Karya	6.579	495	03-Des-18	25-Feb-20	15 Bulan				47,06	50,00		
V	BBWS MESUJI	39	PT. Bina Buana Raya	8.640	???	21-Nop-18	Des. 2019	13 Bulan	26-Feb-19	08-Jul-19	05-Agust-19	70,00	74,77	Lap. Interim	
VI	BBWS C3	19	PT. Bina Buana Raya	3.200	1.943	28-Sep-18	Okt 2019	13 Bulan	20-Feb-19	15-Apr-19	01-Agust-19	37,94	90,83	Lap. Interim	
VII	BBWS CILIWUNG	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIII	BBWS CITARUM	14	PT. Suwanda Karya Mandiri	3.220	2.008	20-Des-18	13-Nop-19	11 Bulan	12-Feb-19	25-Apr-19	02-Okt-19	74,49	74,49	Lap. Interim	
IX	BBWS CITANDUY	24	PT. Mitraplan Enviratama KSO PT. Nadiputra Pratama	3.814	350	20-Des-18	Apr-20	16 Bulan	29-Jan-19	05-Agust-19	02-Mar-20	68,75	69,02	Lap. Interim	- Nilai kontrak, dipa, progress keuangan dan fisik kew. Kab/Kota termasuk dengan nilai kew. Provinsi
X	BBWS CIMANUK CISANGGARUNG	48	PT. Suwanda Karya Mandiri	9.994	3.157	23-Okt-18	15-Jan-20	15 Bulan	14-Jan-19	13 Mei 2019; 24 Mei 2019; 4 Jul 2019	25-Nop-19	52,87	88,49	Lap. Interim 3	
XI	BBWS PEMALI JUANA	18	PT. Inakko Internasional Konsulindo			12-Jun-19	09-Des-19	6 Bulan	09-Jul-19	29-Okt-19	29-Nop-19	61,00	61,00	Lap. Pendahuluan	Laporan Pendahuluan dilakukan di BBWS Pemali Juana
			PT. Cipta Rencana			12-Jun-19	09-Des-19	6 Bulan	09-Jul-19	29-Okt-19	29-Nop-19	72,00	72,00	Lap. Pendahuluan	Laporan Pendahuluan dilakukan di BBWS Pemali Juana
XII	BBWS SERAYU OPAK	36	Konsultan KSO PT. Gracia Widyakarsa PT. Saka Buana Yasa Selaras KSO PT. Multimera Harapan	4.987	5.181	28-Nop-18	24 Agt 2019 (adendum)	9 Bulan (adendum)	25-Jan-19	29 April 2019; 2 Juli 2019	22-Jul-19	#####	92,26	Lap. Interim 2	- Nilai % Keuangan masih perlu konfirmasi Balai karena ada error dalam menginput data emon - Nilai Dipa kewenangan Kab termasuk dengan nilai dipa Kew. Pusat & Provinsi

PROGRAM & CAPAIAN SID IPDMIP DI KEWENANGAN KABUPATEN /KOTA (LANJUTAN)

Status : 25 Oktober 2019

NO	URAIAN	Jumlah DI	Konsultan SID	Nilai Kontrak	Nilai DIPA	Kontrak			Tahap SID			% PROGRES			Keterangan
				Rp (x 1000.000)	Rp (x 1000.000)	Mulai	Selesai	Durasi	Lap. Pendahuluan	Lap. Interim	Lap. Akhir	% KEU	FISIK		
													%	Laporan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
XIII	BBWS BENGAWAN SOLO	45	PT. Daya Cipta Dianrancana KSO PT. Nadiputra Pratama	12.202	3.181	30-Nop-18	Des. 2019	12 Bulan	30-Jan-19	09-Apr-19	24-Okt-19	33,00	76,36	Lap. Interim	
XIV	BBWS BRANTAS	38	PT. Indra Karya KSO PT. Ika Adya Perkasa	6.594	863	03-Des-18	28-Nop-19	12 bulan	26-Mar-19	15-Jul-19	30-Okt-19	59,98	45,28	Lap. Interim	
			PT. Sarana Bhuana Jaya KSO PT. Parama Krida Pratama KSO PT. Saka Buana Yasa Selaras	8.215	863	03-Des-18	28-Nop-19	12 bulan				59,98	34,97	Lap. Interim	
XV	BWS KALIMANTAN I	22	PT. Daya Cipta Dianrancana KSO PT. Intimulya Multikencana	8.718	2.439	14-Sep-18	4 Juni 2019 (adendum 2 bulan)	6 bulan (+2 bulan)	06-Feb-19	15-Mei-19	30-Okt-19	8,59	55,63	Lap. Akhir	- Nilai kontrak kew. Kab/Kota termasuk dengan nilai kontrak sebagian kew. Provinsi - Nilai Dipa, progress keuangan dan fisik kew. Kab/Kota termasuk dengan nilai kew. Provinsi
XVI	BWS KALIMANTAN II	25	PT. Yodya Karya	7.869	1.079	29-Nop-18	24-Okt-19	11 Bulan	15-Jan-19	16 Mei 2019;	01-Okt-19	14,60	#####	Lap. Interim	
XVII	BWS SULAWESI I	24	PT. Indra Karya	3.700	604	30-Nop-18	24-Nop-19	12 Bulan	04-Feb-19	27-Mar-19	22-Mei-19	48,55	90,90	Lap. Akhir	
			PT. Rayakonsult KSO PT. Sarana Dian Persada	4.750	1.272	30-Nop-18	24-Nop-19	12 Bulan				56,07	80,83	Lap. Akhir	
XVIII	BWS SULAWESI III	27	PT. Mitraplan Enviratama KSO PT. Nadiputra Pratama	9.766	1.314	29-Nop-18	Feb. 2020	16 Bulan	17-Jan-19	25 Juni 2019 DI Prioritas	03-Okt-19	50,00	74,87	Lap. Interim 3	
XIX	BBWS POMPENGAN JENEBERANG	37	PT. Esa Pratama Cipta	6.076	1.000	30-Nop-18	27-Nop-19	12 Bulan	19-Des-18	24-Apr-19	14-Okt-19	17,00	65,00	Lap. Interim	
			PT. Aditya Engineering	5.903	1.000	30-Nop-18	27-Nop-19	12 Bulan				60,00	64,22	Lap. Interim	
XX	BWS NUSA TENGGARA I	28	PT. Indra Karya	9.492	1.000	27-Des-18	04-Jan-20	13 Bulan	11-Mar-19	28-Agust-19	06-Jan-20	60,00	63,88	Lap. Interim	
XXI	BWS NUSA TENGGARA II	17	PT. Bina Buana Raya	6.396	1.334	20-Des-18			04-Mar-19	4 Juli 2019; 23 Okt 2019	27-Nop-19	56,29	85,60	Lap. Interim 2	- Nilai kontrak, dipa, progress keuangan dan fisik kew. Kab/Kota termasuk dengan nilai kew. Provinsi
TOTAL		608		162.346	34.445										

REKAPITULASI KESIAPAN DESAIN DI PRIORITAS IPDMIP TAHUN 2019

Status : 25 Oktober 2019

No.	BBWS / BWS	TARGET			Desain Siap & Sudah Diserahkan kepada Daerah			Desain Siap & Belum Diserahkan kepada Daerah			Desain Belum Siap			TOTAL Desain per BBWS / BWS
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Pusat	Provinsi	Kab/Kota	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	BWS Sumatera I	1	3	5	-	-	-	-	-	-	1	3	5	9
2	BWS Sumatera II	-	2	13	-	2	9	-	-	-	-	-	4	15
3	BWS Sumatera V	1	3	13	-	-	-	-	-	-	1	3	13	17
4	BBWS Sumatera VIII	-	4	5	-	4	5	-	-	-	-	-	-	9
5	BBWS Mesuji Sekampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BBWS Cidanau Ciujung Cidurian	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
7	BBWS Ciliwung Cisdane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	BBWS Citarum	1	2	6	-	-	6	-	-	-	1	2	-	9
9	BBWS Citanduy	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9
10	BBWS Cimanuk Cisinggarung	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	7
11	BBWS Pemali Juana	4	-	2	-	-	-	-	-	-	4	-	2	6
12	BBWS Serayu Opak	-	-	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-	6
13	BBWS Bengawan Solo	-	3	2	-	3	2	-	-	-	-	-	-	5
14	BBWS Brantas	-	5	6	-	-	2	-	2	-	-	3	4	11
15	BWS Kalimantan I	1	-	7	-	-	4	-	-	3	1	-	-	8
16	BWS Kalimantan II	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5
17	BWS Sulawesi I	1	3	3	1	3	2	-	-	-	-	-	1	7
18	BWS Sulawesi III	1	2	10	-	2	10	-	-	-	1	-	-	13
19	BBWS Pompengan Jeneberang	-	2	6	-	2	6	-	-	-	-	-	-	8
20	BWS Nusa Tenggara I	2	6	14	-	-	-	-	-	-	2	6	14	22
21	BWS Nusa Tenggara II	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10
TOTAL Per Kewenangan		13	36	128	1	16	52	-	2	10	12	18	66	177
					1%	9%	29%	0%	1%	6%	7%	10%	37%	
					39%			7%			54%			

PEMAPARAN MASING-MASING BALAI MENGENAI KESIAPAN LELANG DI KEWENANGAN PROVINSI & KABUPATEN MELIPUTI :

1. Profil dan gambaran singkat seluruh Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Provinsi dan Kabupaten yang masuk dalam daftar DI kesepakatan dan yang telah/ sedang disusun SID nya;
2. Progres pelaksanaan DLI 8 (Rehabilitasi Irigasi), utamanya paket Konsultansi Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi dan Kabupaten serta paket fisik rehabilitasi (jika sudah terlaksana);
3. Peta lokasi masing-masing DI kewenangan Provinsi & Kabupaten;
4. Kendala/ permasalahan (teknis, sosial, lingkungan, dana, dll) serta tindak lanjut solusinya;
5. Dokumen/ penjelasan teknis penunjang dokumen lelang yang meliputi:
 - BOQ;
 - Engineering Estimate (EE);
 - Owner Estimate* (OE);
 - Spesifikasi Teknis;
 - Time Frame Pelaksanaan Lelang sampai tanda tangan kontrak.
6. Mengisi Form Rencana Penarikan Dana/ Penyerapan khusus DLI 8 hingga akhir pelaksanaan kegiatan;
7. Mengisi Form Rencana Kerja (*Action Plan*)



TERIMA KASIH
