



DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI


PERKEMBANGAN PELAKSANAAN DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI IPDMIP

INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT MANAGEMENT OF IRRIGATION
PROGRAM
(IPDMIP)





ESTIMASI KERUSAKAN	TOTAL DAERAH IIRIGASI	KEWENANGAN			TOTAL AREA	JUMLAH PROV/KAB
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN		
> 40 %	719	143,872 Ha	55,887 Ha	126,793Ha	326,522 Ha	16/74
		45 DI	93 DI	581 DI		

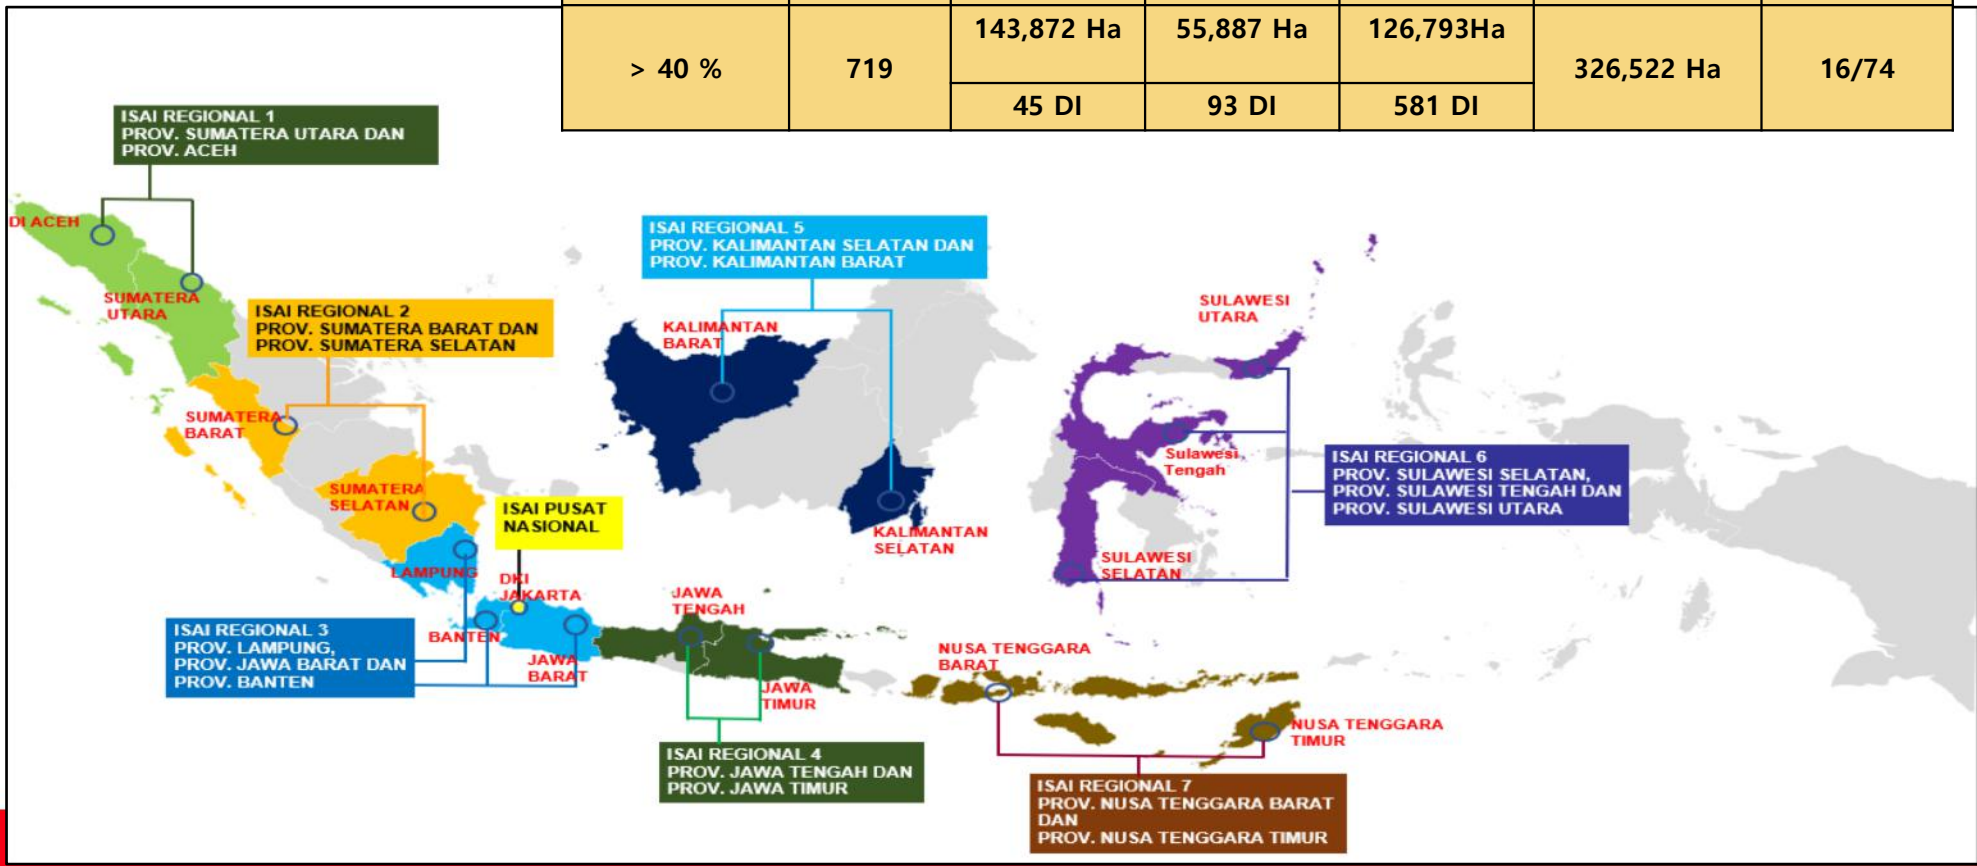



TOTAL ALOKASI ANGGARAN IPDMIP

NO	URAIAN	Rp Ribu		
		ADB 83.3%	AIF 16.7%	TOTAL
1	PUSAT	98.920.678	19.831.637	118.752.315
2	PROVINSI	80.248.700	16.088.275	96.336.975
3	KABUPATEN	55.053.697	11.037.176	66.090.873
	TOTAL	234.223.076	46.957.087	281.180.163

RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN IPDMIP S/D NOVEMBER 2018

PROVINSI / KABUPATEN	AWP 2018	Realisasi	Presentase (%)
Pusat	17.688.000	8.000.000	45%
Provinsi	12.242.950	1.363.631	11,1%
Kabupaten	15.614.882	3.847.630	24,6%
TOTAL	45.545.832	13.211.261	29%



TARGET DLI KOMPONEN BANGDA

No	Indikator	Baseline	2017	s/d 2018	s/d 2019	s/d 2020	s/d 2021
1: Penguatan Sistem & Kapasitas Kelembagaan Irigasi Pertanian yang Berkelanjutan							
DLI 3	Komisi Irigasi beroperasi penuh pada 74 Kabupaten 14 Provinsi tahun 2021	33 KOMIR telah terbentuk (belum dilakukan penilaian kinerja)	-	45 KOMIR Provinsi/ Kabupaten beroperasi Penuh	55 KOMIR Provinsi/ Kabupaten beroperasi Penuh	65 KOMIR Provinsi/ Kabupaten beroperasi Penuh	88 KOMIR Provinsi/ Kabupaten beroperasi Penuh
2: Perbaikan Pengelolaan, Operasi & Pemeliharaan Irigasi							
DLI 7	Terbitnya Dokumen PSETK pada 719 Daerah Irigasi	-	-	Minimal 500 dokumen PSETK Terbit	719 dokumen PSETK Terbit	-	-



KEMAJUAN PELAKSANAAN DLI 2018



PELAKSANAAN MONEV KINERJA KOMISI IRIGASI

- Waktu pelaksanaan dari tanggal periode 25 September 2018 – 24 Oktober 2018
- Sasaran Komir 13 Provinsi dan 57 Komir Kabupaten peserta IPDMIP

HASIL MONEV KINERJA KOMIR

No	KOMIR PROVINSI/KABUPATEN	Klasifikasi Kinerja			total
		Baik	Cukup	Kurang	
1	PROVINSI	9	4	0	13
2	KABUPATEN	25	13	19	57
	total	34	17	19	70

KINERJA KOMIR TAHUN 2018



PROSENTASE KINERJA KOMIR PROVINSI



PROSENTASE KINERJA KOMIR KABUPATEN






KEMAJUAN PELAKSANAAN PSETK PADA KEWENANGAN PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN TAHUN 2018

KEMAJUAN PELAKSANAAN PSETK PADA KEWENANGAN PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN per BULAN TAHUN 2018

NO	KEWENANGAN	Target 2018-2019	Capaian 2018
		(luas/jml DI)	(luas /jml DI)
1	TOTAL KEWENANGAN PUSAT	464.950	22.457
		49	6
2	TOTAL KEWENANGAN PROVINSI	151.287	35.827
		89	21
3	TOTAL KEWENANGAN KABUPATEN	234.802	68.698
		581	158
TOTAL (ha)		851.039	126.982
TOTAL DI		719	185

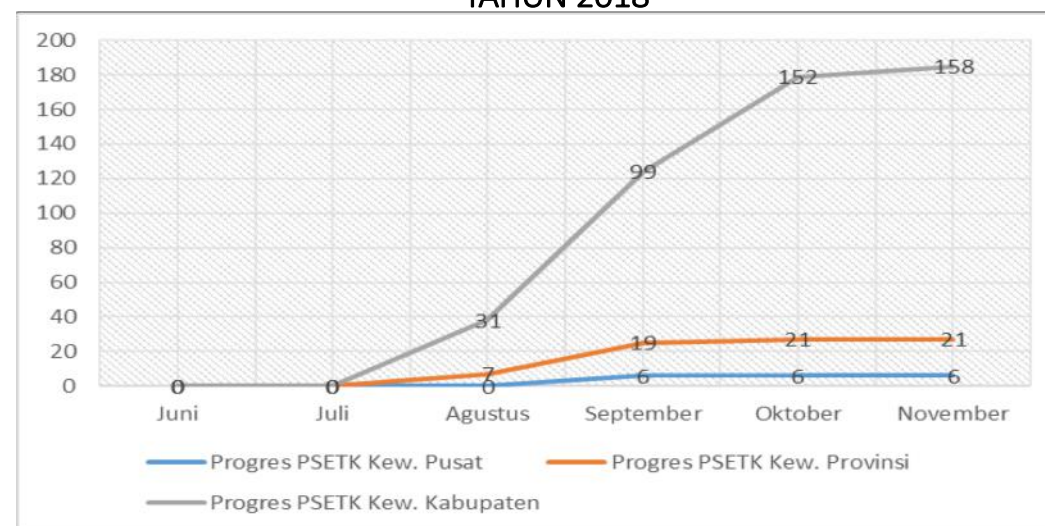

% CAPAIAN PENYUSUNAN PSETK PADA KEWENANGAN PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN

NO	KEWENANGAN	% Capaian
1	KEWENANGAN PUSAT	0,8%
2	KEWENANGAN POVINSI	2,9%
3	KEWENANGAN KABUPATEN	22,0%
	TOTAL	25,7%



CAPAIAN DLI KOMPONEN BANGDA

DLI	Indikator	Baseline	2017	s/d 2018		s/d 2019		s/d 2020		s/d 2021	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
DLI 3	Komisi Irigasi beroperasi penuh pada 74 Kabupaten 14 Provinsi 2021	33 KOMIR telah terbentuk	-	45 KOMIR Provinsi/Kabupaten beroperasi Penuh	50 KOMIR (13 prov dan 37 kab) telah beroperasi	55 KOMIR Provinsi/Kabupaten beroperasi Penuh		65 KOMIR Provinsi/Kabupaten beroperasi Penuh			88 KOMIR Provinsi/Kabupaten beroperasi Penuh
DLI 7	Terbitnya Dokumen PSETK pada 719 Daerah Irigasi	-	-	Setidaknya 500 dokumen PSETK Terbit	158 DI dalam tahap Penyusunan PSETK	719 dokumen PSETK Terbit		-			-



PERMASALAHAN PELAKSANAAN IPDMIP



PERMASALAHAN PELAKSANAAN PSETK

1. keterlambatan dari DIPA perubahan sehingga pada tahun 2018 tidak mungkin dilaksanakan PSETK
2. Kepastian NPHD ditandatangani Bulan Februari 2018. Penganggaran tahun 2018 pada APBD perubahan, capaian rendah
3. Penganggaran APBD sudah mulai menggunakan system e planning, sehingga daerah perlu memasukkan kegiatan IPDMIP kedalam sistem terlebih dahulu
4. Keterbatasan kemampuan daerah dalam penganggaran

Terima Kasih

